



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЖИЛЬЕ"

Руководитель:

Заместитель председателя комитета строительства
Волгоградской области

Валентин Александрович Сучков





РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЖИЛЬЕ"

План реализации регионального проекта на 2020 год

Объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию


Предоставлены земельные участки для жилищного строительства

Строительно-монтажные работы завершены

Получено разрешение на строительство объектов

Земельный участок предоставлен заказчику
(под строительство дороги и школы)

Заключено соглашение с Минстроем России на 2020 год
(строительство дороги и школы)

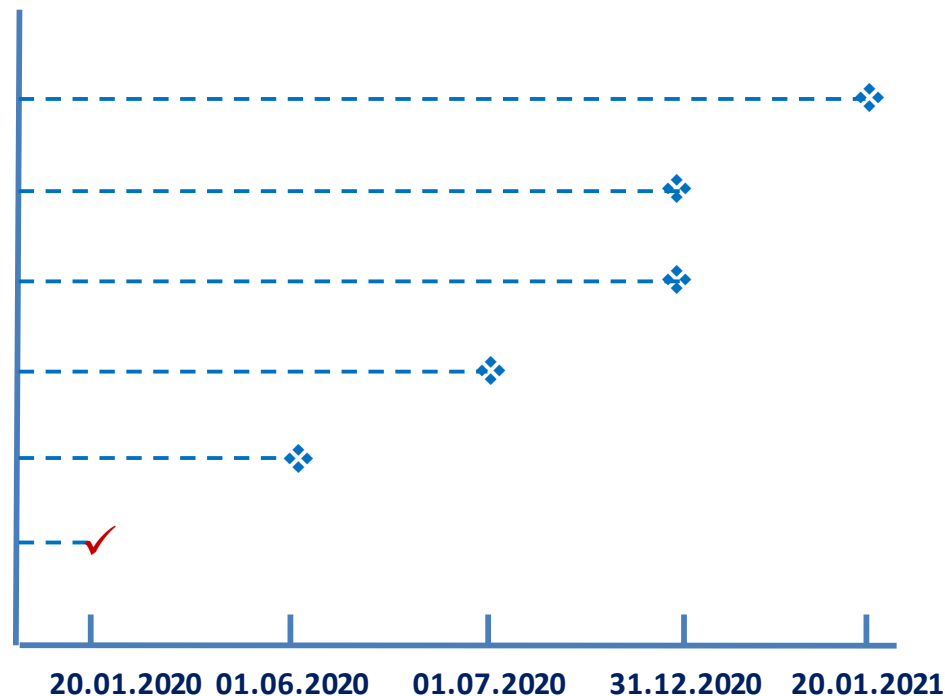

Общий статус реализации проекта

Риски	Показатели	Бюджет	Результаты	Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

Факт исполнения
24.12.2019

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЖИЛЬЕ"

Предусмотрено на 2020 год

ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2020 год

в том числе на строительство:

дороги по ул. Родниковая

445,1

млн. рублей

185,3

млн. рублей

181,5

3,0

0,8

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

школы на 800 мест

259,8

млн. рублей

254,7

4,1

1,0

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ


ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

103,0

млн. рублей

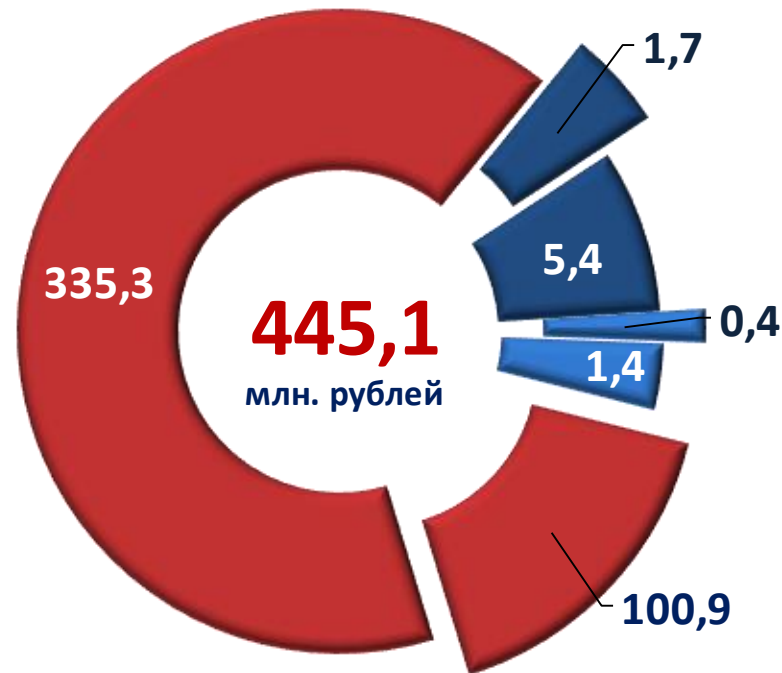

■ ФБ ■ ОБ ■ МБ

ОСВОЕНО
103,0 млн. рублей
(23%)



ВВОД ЖИЛЬЯ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛАН ВВОДА ЖИЛЬЯ

91,5

ТЫС. КВ.М

ФАКТ ВВОДА ЖИЛЬЯ
(на 01.03.2020)

4,3

ТЫС. КВ.М

ПРОГНОЗ ВВОДА ЖИЛЬЯ

91,5

ТЫС. КВ.М



ЖК "ДОЛИНА" в Советском районе Волгограда
Объект – **Дорога по ул. Родниковая** (1265 метров)
Стоимость строительства – **185,2 млн.руб.**
Срок строительства – **2020 г.**
Показатель по вводу жилья в ЖК "Долина" – **36,0 тыс.кв.м,**
из которых **введено – 4,3 тыс.кв.м.**
30.03.2020 заключен муниципальный контракт



ЖК в Кировском районе Волгограда
Объект – **Школа по ул.им.Григория Засекина** (800мест)
Стоимость строительства – **599,6 млн.руб.**
(в т.ч. 259,8 млн.руб. – 2020 г.; 339,8 млн.руб. – 2021 г.)
Срок строительства – **2020–2021 гг.**
Показатель по вводу жилья – **55,5 тыс.кв.м**
05.03.2020 заключен муниципальный контракт


УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПЛАН ВВОДА ЖИЛЬЯ **900**
ТЫС. КВ.М

ФАКТ ВВОДА ЖИЛЬЯ **58,1**
(на 01.03.2020)
ТЫС. КВ.М

ПРОГНОЗ ВВОДА ЖИЛЬЯ **727**
ТЫС. КВ.М

ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЬЯ 2018 – 2020 гг.

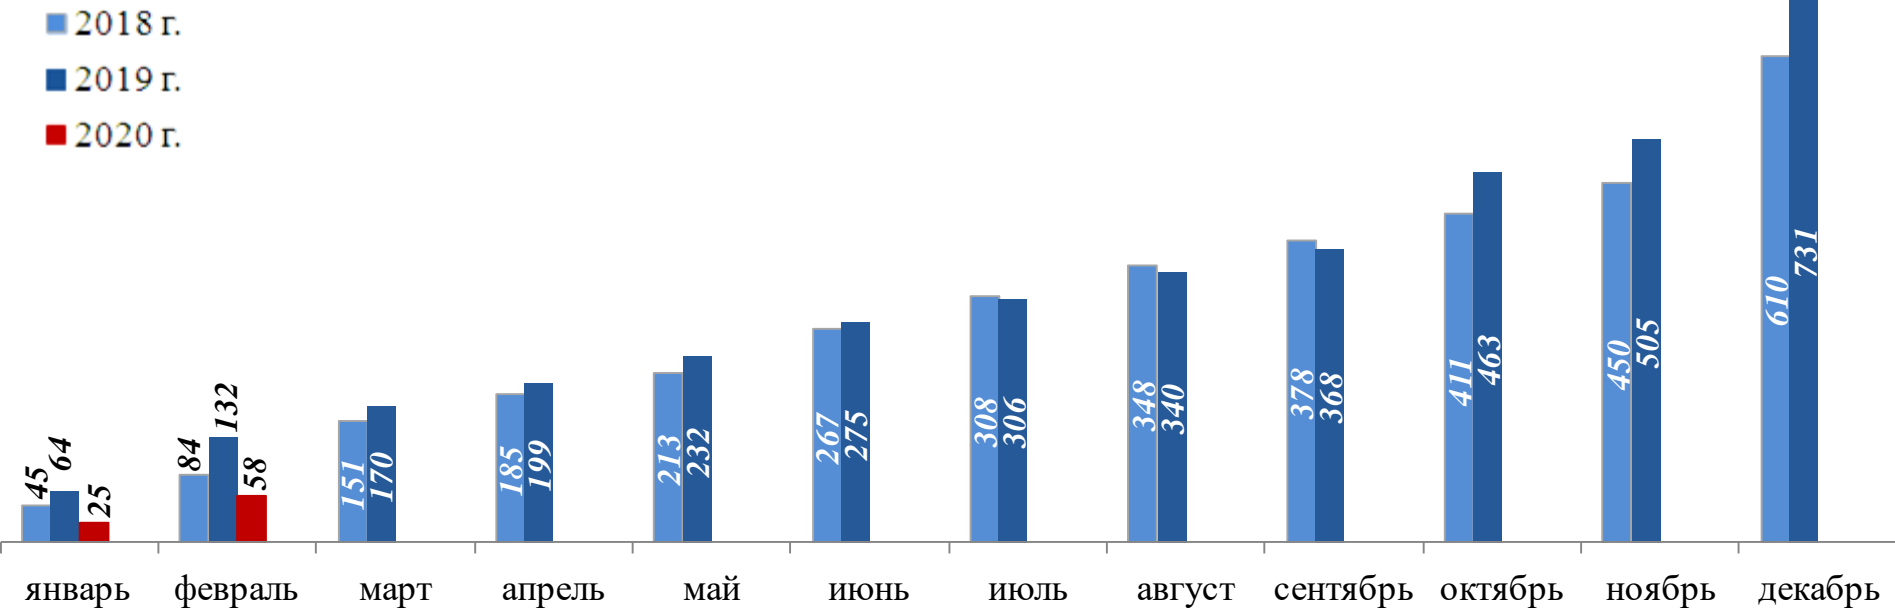



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

