



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЖИЛЬЕ"

по состоянию на 01.05.2020

Руководитель:

Председатель комитета строительства
Волгоградской области

Юрий Юрьевич Чувашин



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЖИЛЬЕ"

План реализации регионального проекта на 2020 год

Объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию


Предоставлены земельные участки для жилищного строительства

Строительно-монтажные работы завершены

Получено разрешение на строительство объектов

Земельный участок предоставлен заказчику
(под строительство дороги и школы)

Заключено соглашение с Минстроем России на 2020 год
(строительство дороги и школы)

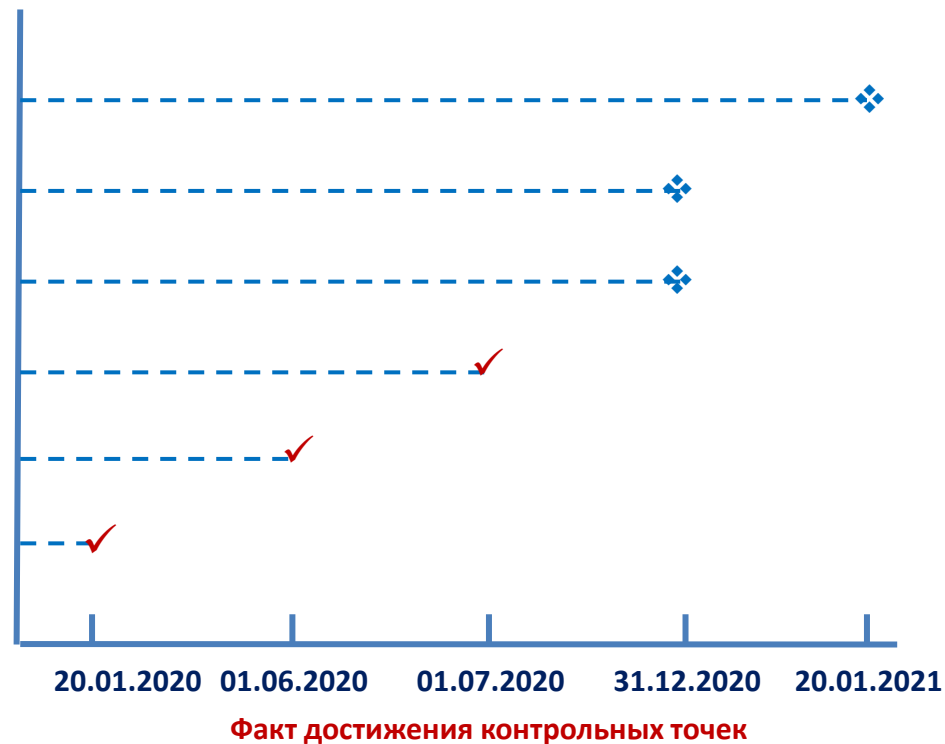

Общий статус реализации проекта

Риски	Показатели	Бюджет	Результаты	Контрольные точки
отсутствии отклонений	отсутствии отклонений	отсутствии отклонений	отсутствии отклонений	отсутствии отклонений

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЖИЛЬЕ"

Предусмотрено на 2020 год

ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2020 год

в том числе на строительство:

дороги по ул. Родниковая

445,1
млн. рублей

185,3
млн. рублей

181,5

3,0

0,8

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

школы на 800 мест

259,8
млн. рублей

254,7

4,1

1,0


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

103,0
млн. рублей

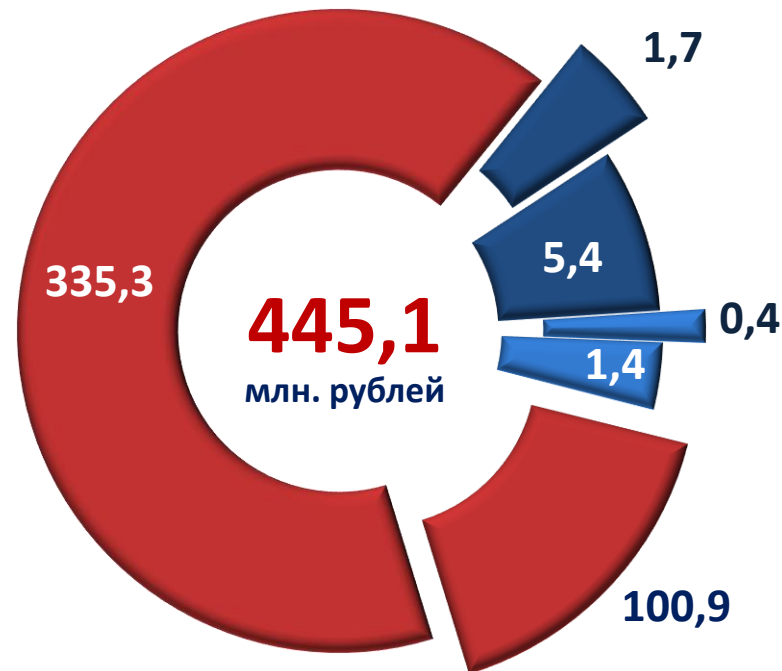

■ ФБ ■ ОБ ■ МБ

ОСВОЕНО
103,0 млн. рублей
(23%)



ВВОД ЖИЛЬЯ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛАН ВВОДА ЖИЛЬЯ

91,5

ТЫС. КВ.М

ФАКТ ВВОДА ЖИЛЬЯ
(на 01.05.2020)

19,2

ТЫС. КВ.М

ПРОГНОЗ ВВОДА ЖИЛЬЯ

91,5

ТЫС. КВ.М



ЖК "ДОЛИНА" в Советском районе Волгограда
Объект – **Дорога по ул. Родникова (1265 метров)**
30.03.2020 заключен муниципальный контракт
185,2 млн.руб. – стоимость строительства
2020 г. – срок строительства

36,0 тыс.кв.м – показатель по вводу жилья

14,6 тыс.кв.м – введено жилья



ЖК в Кировском районе Волгограда
Объект – **Школа по ул.им. Григория Засекина (800мест)**
05.03.2020 заключен муниципальный контракт
599,6 млн.руб. – стоимость строительства
(в т.ч. **259,8 млн.руб.** – 2020 г.; **339,8 млн.руб.** – 2021 г.)
2020–2021 гг. – срок строительства

55,5 тыс.кв.м – показатель по вводу жилья

4,6 тыс.кв.м – введено жилья


УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПЛАН ВВОДА ЖИЛЬЯ **900**
ТЫС. КВ.М

ФАКТ ВВОДА ЖИЛЬЯ **155,6**
(на 01.05.2020)
ТЫС. КВ.М

ПРОГНОЗ ВВОДА ЖИЛЬЯ **768**
ТЫС. КВ.М

ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЬЯ 2018 – 2020 гг.

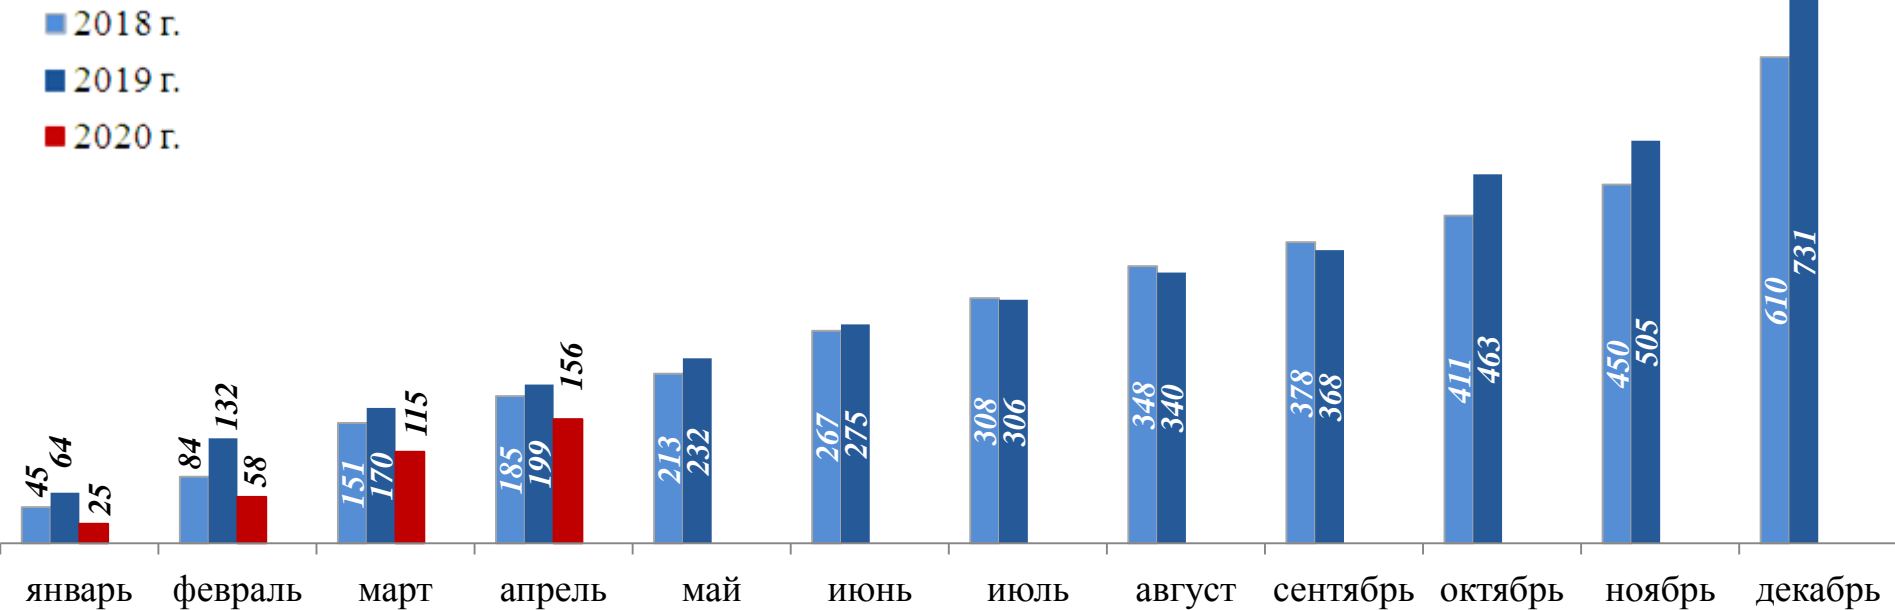



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

